

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



2021年11月18日

拍攝日期：
110 年 11 月 18 日

地點：
A1 區

說明：
1F 柱、外牆澆置
&支撐架組立中



2021年11月18日

拍攝日期：
110 年 11 月 18 日

地點：
A2 區西側

說明：
1F 板西側澆置完成
柱筋續接作業



2021年11月18日

拍攝日期：
110 年 11 月 18 日

地點：
A3 區西側

說明：
1F 柱模組立澆置



2021年11月19日


拍攝日期：
110 年 11 月 19 日

地點：
A2&A3 區東側

說明：
11/19 進行澆置作業

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片

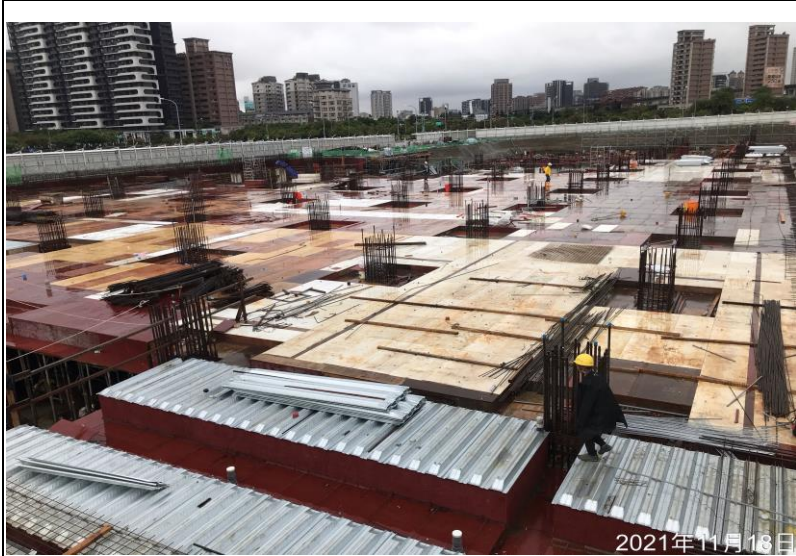

拍攝日期：
110 年 11 月 18 日

地點：
A4&A5 區

說明：
1F 板模組立延伸
水電配合放樣作業

2021年11月18日




拍攝日期：
110 年 11 月 18 日

地點：
B2 區

說明：
已完成部分 B1F 板
柱筋續接作業中

2021年11月18日

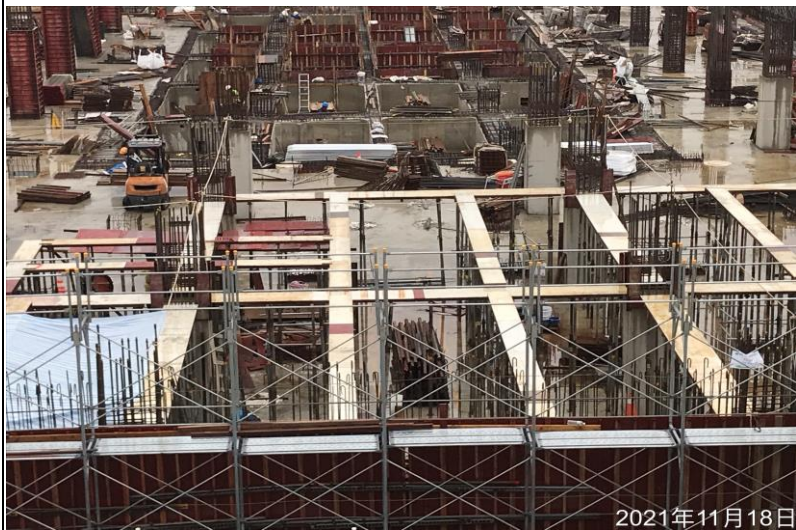


拍攝日期：
110 年 11 月 18 日

地點：
B1 區

說明：
1F 樑模組立
外牆澆置預備

2021年11月18日

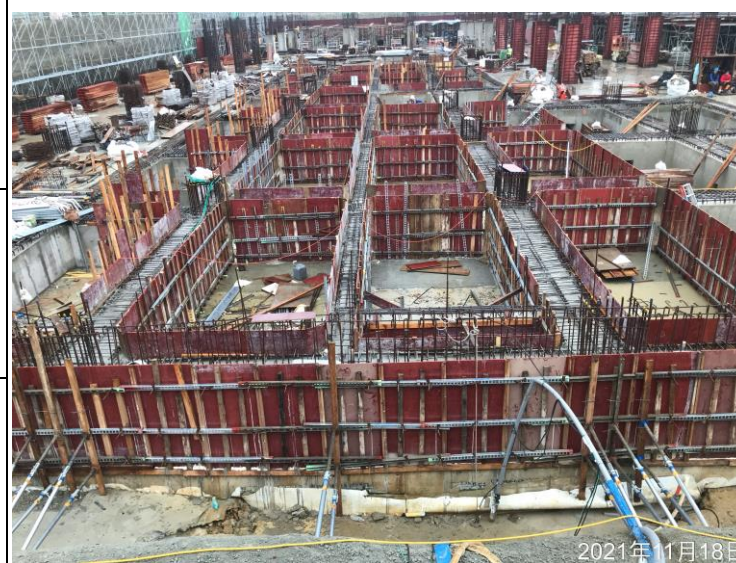

拍攝日期：
110 年 11 月 18 日


地點：
B2 區

說明：
地樑澆置養護中
預備拆模

2021年11月18日

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片

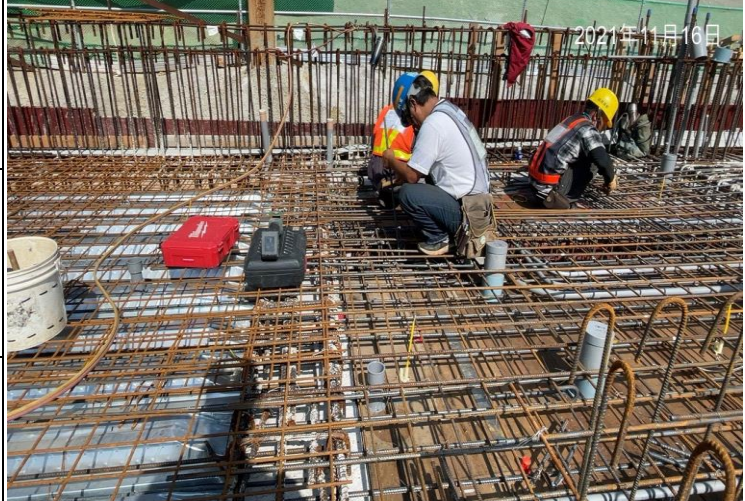	拍攝日期： 110 年 11 月 14 日 地點： A2 區 1F 板 說明： 給水川樑套管留設		拍攝日期： 110 年 11 月 16 日 地點： A5 區 B1F 板 說明： 排水用套管留設
	拍攝日期： 110 年 11 月 17 日 地點： B1 區 B1F 板 說明： 廁所小便斗給排水 施作		拍攝日期： 110 年 11 月 18 日 地點： B2 區 通道 說明： 筏基連通管口清理

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
110 年 11 月 14 日

地點：
A2 區

說明：
1F 板電氣放樣



拍攝日期：
110 年 11 月 15 日

地點：
A2 區


說明：
1F 板電氣 RC 放樣配管



拍攝日期：
110 年 11 月 17 日

地點：
A2 區

說明：
1F 板電氣 RC 配管

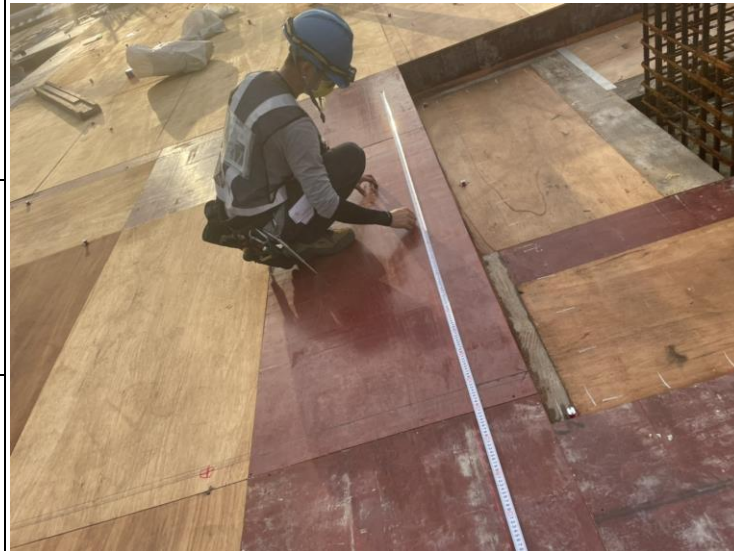





拍攝日期：
110 年 11 月 18 日

地點：
A4 區

說明：
1F 板電氣放樣

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片

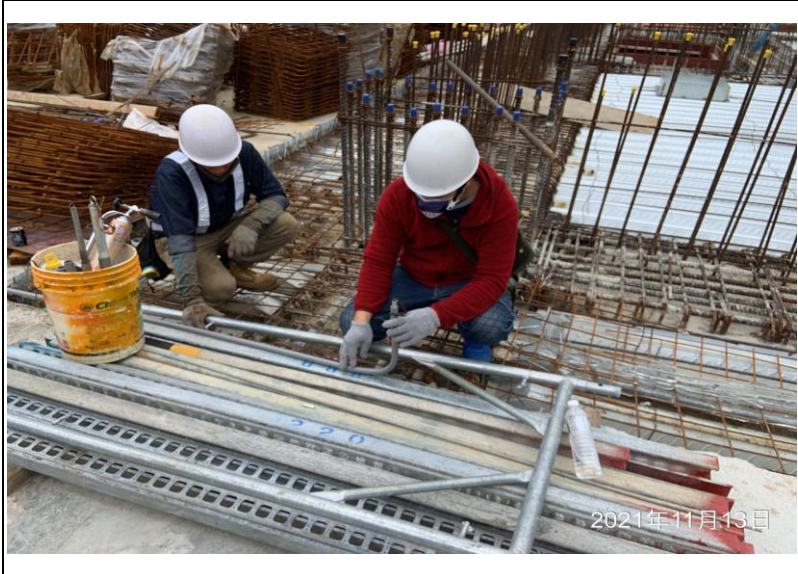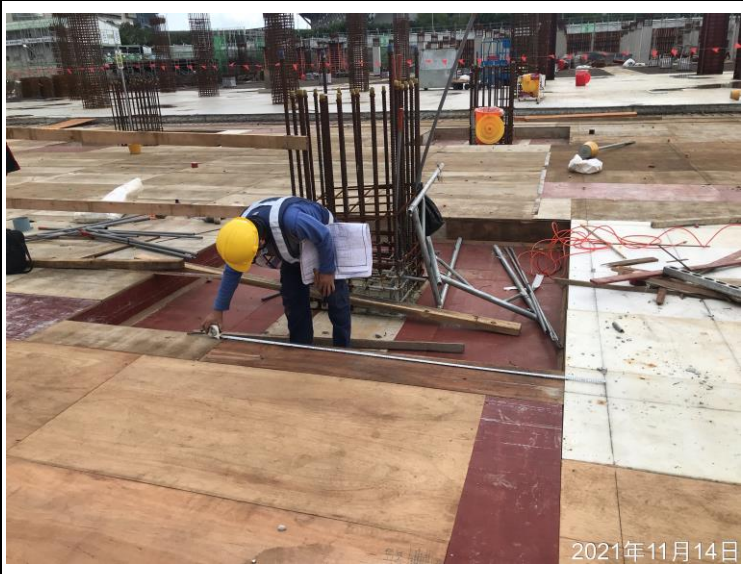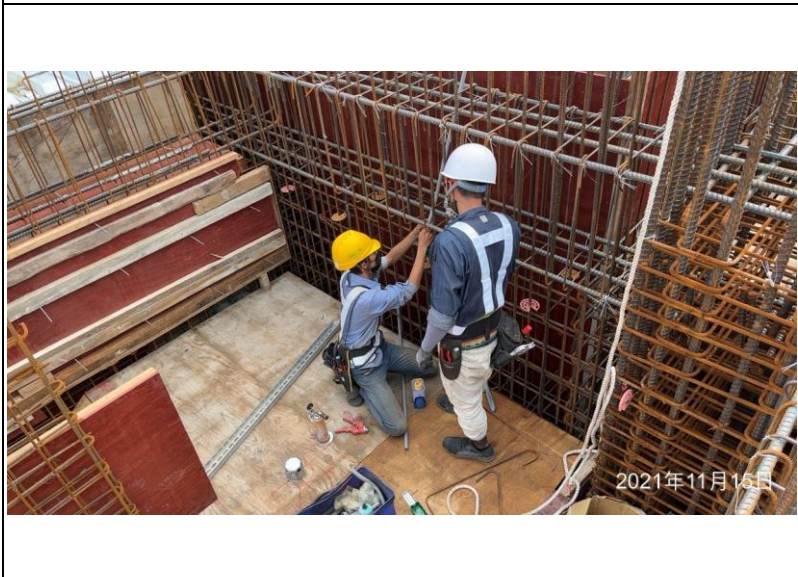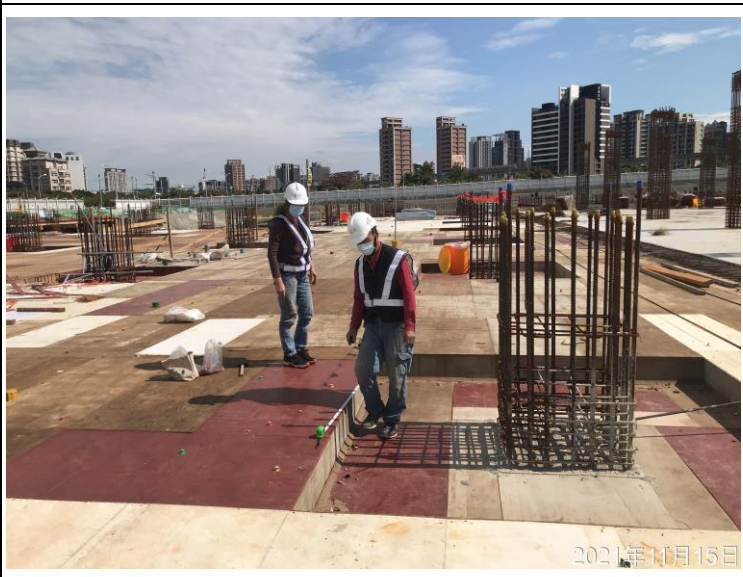	拍攝日期： 110 年 11 月 13 日 地點： A5 區 說明： B1F 板 RC 消防配管		拍攝日期： 110 年 11 月 14 日 地點： A4 區 說明： 1F 板 RC 消防放樣
	拍攝日期： 110 年 11 月 15 日 地點： A2 區 說明： 1F 樓梯板 RC 消防配管		拍攝日期： 110 年 11 月 15 日 地點： A4 區 說明： 1F 板 RC 消防放樣

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
110 年 11 月 17 日

地點：
工務所簡報區

說明：
中興監造外部稽核

2021年11月17日



拍攝日期：
110 年 11 月 17 日

地點：
1 號門廣場

說明：
中興監造外部稽核

2021年11月17日



拍攝日期：
110 年 11 月 18 日

地點：
北向置料區

說明：
監造二級查驗
2.0mm 單心 PVC 線
進場查驗

2021年11月18日



拍攝日期：
110 年 11 月 18 日


地點：
北向置料區

說明：
監造二級查驗
2.0mm 單心 PVC 線
進場查驗

2021年11月18日

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片

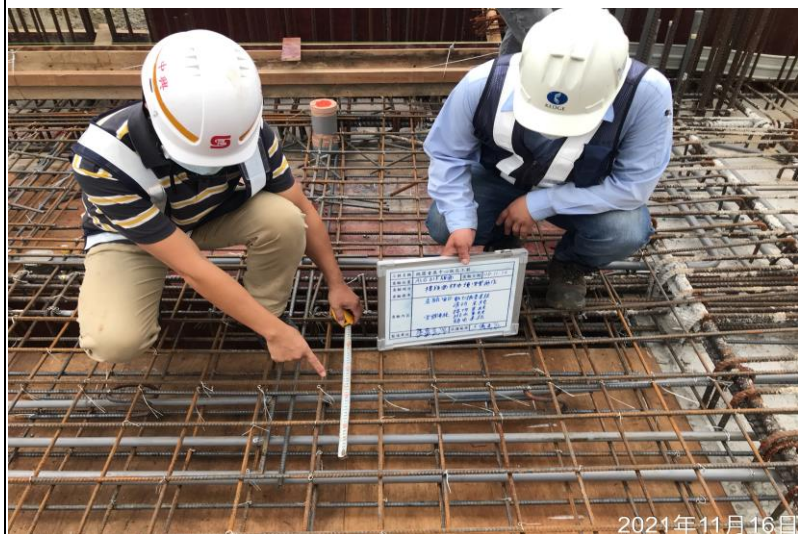

拍攝日期：
110 年 11 月 16 日

地點：
A5 區 B1F 板

說明：
監造二級查驗
配管間距、方式
&材料查驗

2021年11月16日




拍攝日期：
110 年 11 月 16 日

地點：
A5 區 B1F 板

說明：
監造二級查驗
消防箱出管位置
測量查驗

2021年11月16日

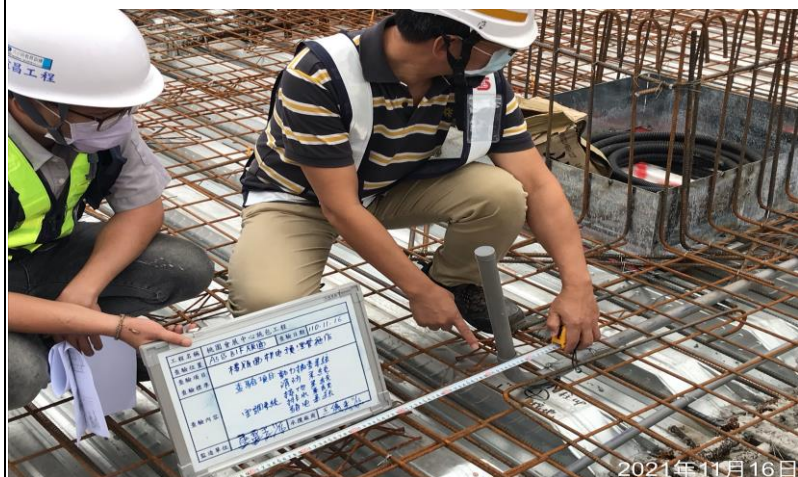


拍攝日期：
110 年 11 月 16 日

地點：
A5 區 B1F 板

說明：
監造二級查驗
基礎座接地線
出線
位置查驗

2021年11月16日

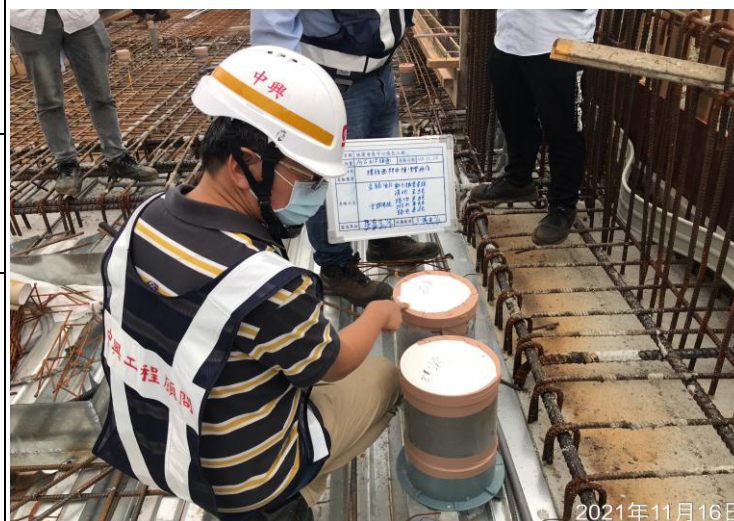

拍攝日期：
110 年 11 月 16 日

地點：
A5 區 B1F 板

說明：
監造二級查驗
排水套管尺寸&
留設位置查驗

2021年11月16日
