


根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片

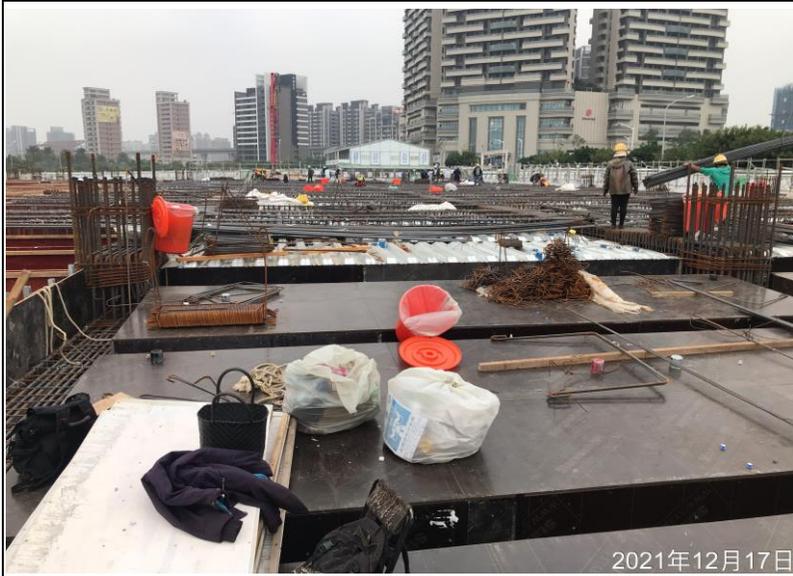

拍攝日期：
110年12月17日

地點：
A1區

說明：
2F板組立
&水電放樣配合

2021年12月17日



拍攝日期：
110年12月17日

地點：
A2區

說明：
2F樑模組立作業中

2021年12月17日



拍攝日期：
110年12月17日

地點：
A3區

說明：
2F板支撐作業中

2021年12月17日



拍攝日期：
110年12月17日


地點：
A4區

說明：
1F柱已查驗完成
預備封模澆置作業

2021年12月17日

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片

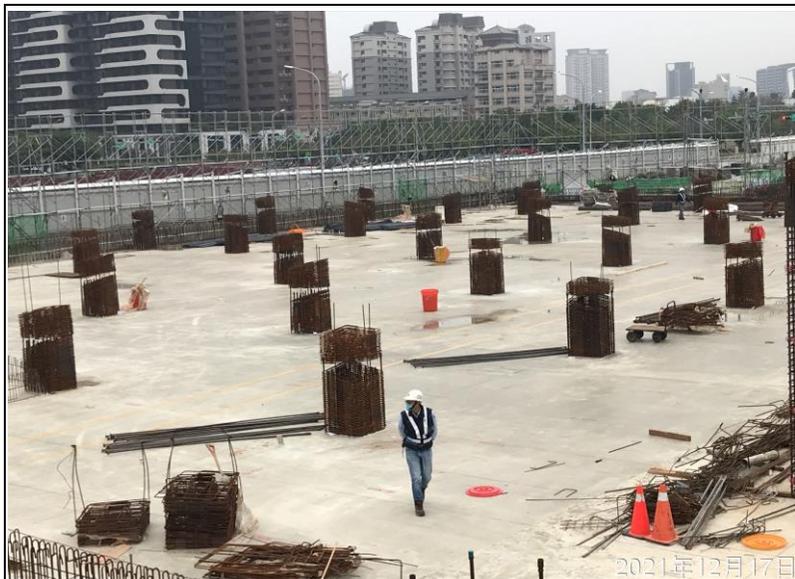

拍攝日期：
110年12月17日

地點：
A5區

說明：
1F板養護及放樣中
柱筋續接預備



拍攝日期：
110年12月18日

地點：
B2區

說明：
已完成部分1F板
持續板模延伸作業中



拍攝日期：
110年12月13日

地點：
A4區1F

說明：
國貿局現場會勘稽核



拍攝日期：
110年12月13日

地點：
A5區1F

說明：
國貿局現場會勘稽核

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片

	<p>拍攝日期： 110年12月11日</p> <p>地點： A5區1F板</p> <p>說明： 消防板面RC配管</p>		<p>拍攝日期： 110年12月14日</p> <p>地點： A1區2F板</p> <p>說明： 消防板面RC放樣 BOX開孔</p>
	<p>拍攝日期： 110年12月15日</p> <p>地點： A1區2F板</p> <p>說明： 消防RC配管作業</p>		<p>拍攝日期： 110年12月17日</p> <p>地點： B2區B1F柱</p> <p>說明： 緊急照明穿線作業</p>

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片

 <p>2021/12/11 10:31</p>	<p>拍攝日期： 110年12月11日</p> <p>地點： A1區2F板</p> <p>說明： 消防水系統 板面放樣</p>	 <p>2021年12月14日</p>	<p>拍攝日期： 110年12月14日</p> <p>地點： A1區</p> <p>說明： 2F板消防預埋螺絲 放樣</p>
	<p>拍攝日期： 110年12月15日</p> <p>地點： B1區</p> <p>說明： 1F板消防水系統 板面放樣</p>	 <p>2021年12月17日</p>	<p>拍攝日期： 110年12月17日</p> <p>地點： A2區</p> <p>說明： B1F預埋吊子 核對圖面清查標記</p>

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片




拍攝日期：
110年12月10日

地點：
A5區1F板

說明：
發電機基礎座
預留筋施作

2021年12月10日

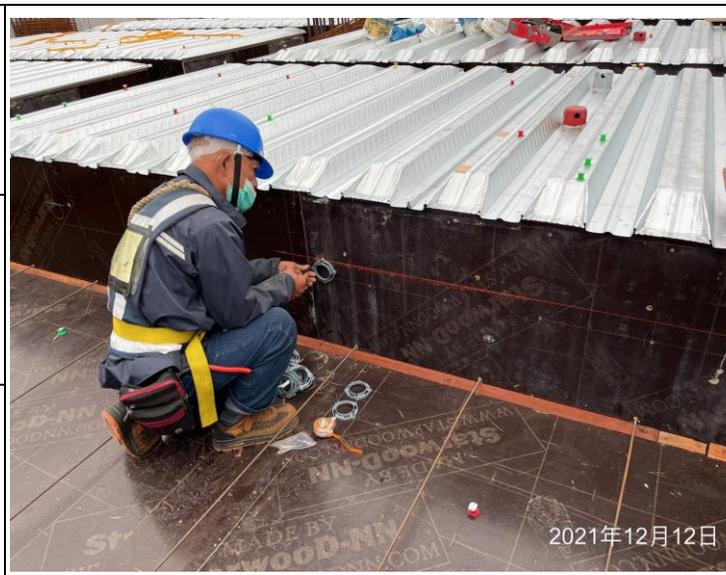


拍攝日期：
110年12月12日

地點：
A1區

說明：
2F板管溝套管施作

2021年12月12日

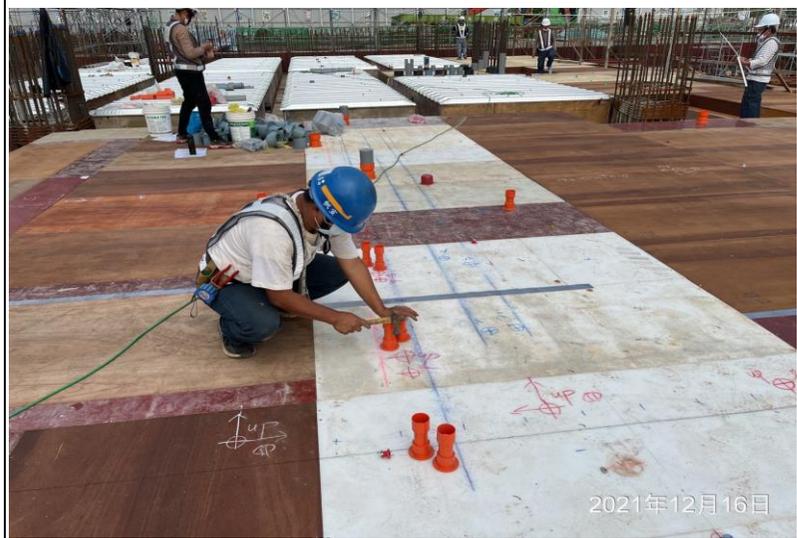


拍攝日期：
110年12月16日

地點：
A4A5-B區

說明：
1F板RC排水樓板
接施作

2021年12月16日

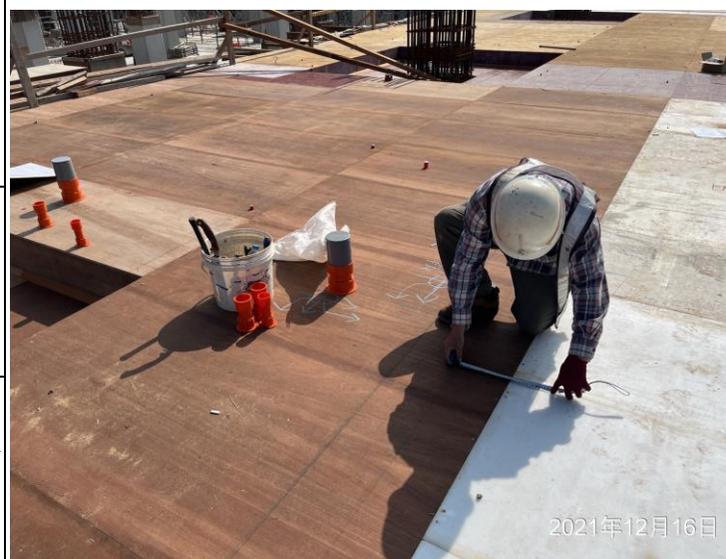

拍攝日期：
110年12月16日

地點：
A4A5-B區

說明：
1F板RC給.排水放
樣

2021年12月16日

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
110年12月13日

地點：
A5區1F板

說明：
監造二級查驗
板面設備出口解說

2021年12月13日




拍攝日期：
110年12月13日

地點：
A5區1F板

說明：
監造二級查驗
預埋螺絲跨距
及分色查驗

2021年12月13日

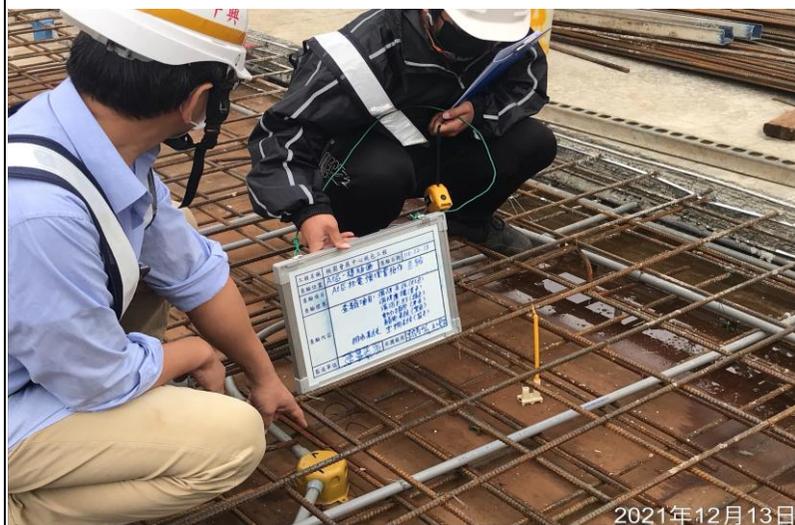

拍攝日期：
110年12月13日

地點：
A5區1F板

說明：
監造二級查驗
系統分色、數量
及配管查驗

2021年12月13日




拍攝日期：
110年12月13日

地點：
A5區1F板

說明：
監造二級查驗
穿樑套管
查驗

2021年12月13日

根基營造『桃園會展中心統包工程』 施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片

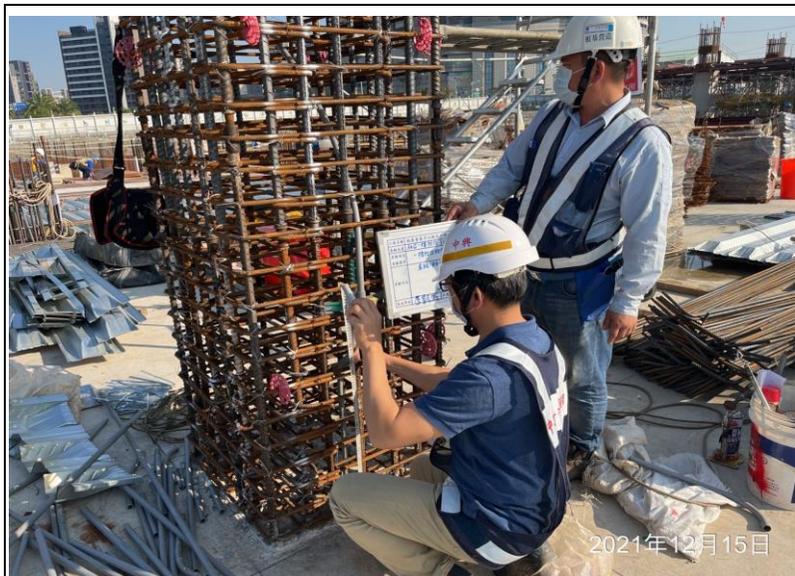

拍攝日期：
110年12月15日

地點：
A4區1F柱

說明：
監造二級查驗
設備出口高度
&材料查驗



拍攝日期：
110年12月15日

地點：
A4區1F柱

說明：
監造二級查驗
避難方向燈出口
高程測量查驗



拍攝日期：
110年12月15日

地點：
A4區1F柱

說明：
監造二級查驗
消防綜合盤高程
位置查驗



拍攝日期：
110年12月15日

地點：
A4區1F柱

說明：
監造二級查驗
防火捲門控制盤
配管及高程查驗
